




REPORTE DE SEGUIMIENTO COMPROMISO POR COLOMBIA – CAMPO Y PAZ

OBRAS POR IMPUESTOS (Corte información a 30 de abril de 2022)

Se han aprobado 50 proyectos por \$394.790 millones de pesos

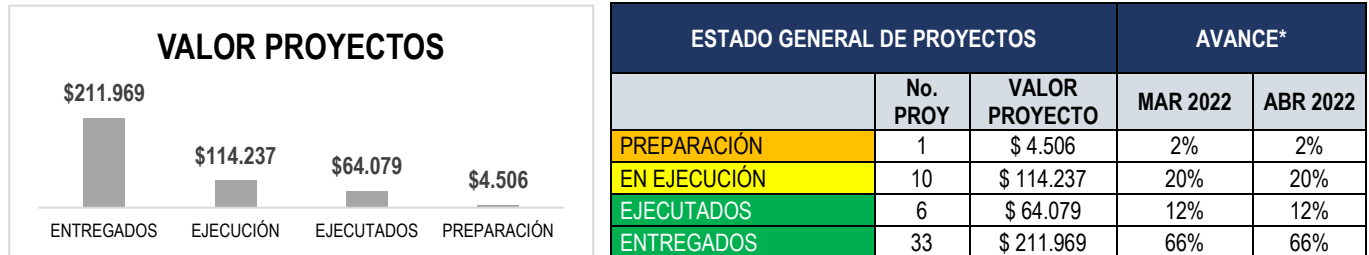

* El porcentaje de avance se mantuvo respecto al mes anterior dado que no se evidencian cambios en los estados de los proyectos.

- En preparación:** el proyecto Dotación de menaje IE Puerto Guzmán se encuentra en proceso de contratación.
- En ejecución:** se identificaron 10 proyectos y todos presentaron avances en ejecución física. Sin embargo, 5 proyectos han presentado atrasos en sus cronogramas por diferentes razones: afectaciones por orden público, desequilibrio económico, renuncia masiva de personal, situaciones climáticas, deficiencias en diseños, incumplimiento por parte del contratista. Actualmente, se encuentran ejecutando planes de contingencia para mejorar los rendimientos de las obras o superar retrasos.
- Ejecutados:** corresponde a 6 proyectos (4 con avance físico del 100% y 2 proyectos con 93,6% y 90,7% que se encuentran en proceso de liquidación). Estos dos últimos se entregarán una vez concluyan los trámites administrativos de liquidación y cierre.
- Terminados:** corresponde a proyectos entregados: 13 entre 2019 y 2020, 17 en 2021 y 3 en 2022. De estos, 9 proyectos del sector vivienda (construcción acueducto, optimización de acueducto, construcción red matriz de conducción planta de tratamiento, unidades Sanitarias); 16 proyectos del sector educación (dotaciones); 7 proyectos del sector transporte (mejoramiento y pavimentación de vías secundarias y terciarias); 1 proyecto del sector trabajo (construcción y dotación bloque de agroindustria Sena).

ENTREGAS DE OBRAS			
Periodo	No. Proyectos programados	AVANCES FRENTE AL REPORTE ANTERIOR	
		No. Proyectos ejecutados* y/o terminados	% avance
2021 - \$ 242.591 millones			
Primer Trimestre	8	9	112%
Segundo Trimestre	10	4	40%
Tercer Trimestre	7	6	86%
Cuarto Trimestre	3	6	200%
2022 - \$ 148.312			
Anual	12	3	25%

*4 proyectos registran un promedio de avance físico del 100%; 2 proyectos más avances del 93,6% y 90,3% que se encuentran en proceso de liquidación y entrega, tal como se indicó en los proyectos ejecutados. **A 30 de abril se presenta un cumplimiento del 25% de la meta anual.**




OBRAS PDET (Corte información a 30 de abril de 2022)

Se han aprobado 580 proyectos por \$119.899 millones**

** Valor Acumulado

VALOR PROYECTOS



ESTADO GENERAL DE PROYECTOS			AVANCE	
ESTADO GENERAL	No. PROY	VALOR PROYECTO	MAR 2022	ABR 2022
EN ESTRUCTURACIÓN			0%	0%
EN EJECUCIÓN	88	\$ 22.197	22%	15%
TERMINADO*	492	\$ 97.703	78%	85%

*Se incluyen 5 obras PDET terminadas y financiadas por parte de territorio de Oportunidades en los cuales no se reporta el valor del proyecto por políticas de la entidad y no están incluidas desde el principio del año.

- **En ejecución:** 53 proyectos corresponden a infraestructura social y comunitaria, 34 proyectos a infraestructura vial y 1 proyecto a infraestructura comunitaria.
- **Terminados:** 276 proyectos corresponden a infraestructura social y comunitaria, 199 proyectos a infraestructura vial, 6 proyectos de infraestructura de servicios públicos, 8 proyectos de infraestructura educativa y 3 proyectos de infraestructura comunitaria. **A 30 de abril se presenta un cumplimiento del 85% de la meta establecida.**

ENTREGAS DE OBRAS

Periodo	No. proyectos programados	AVANCES FRENTE AL REPORTE ANTERIOR	
		No. proyectos terminados	% avance
2021 - \$ 71.600 millones			
Primer trimestre	30	34	113%
Segundo trimestre	50	32	64%
Tercer trimestre	120	106	88%
Cuarto trimestre	200	215	108%
2022 - \$ 48.299 millones			
Primer trimestre	43	66	153%
Segundo trimestre	50	39	78%
Tercer trimestre	120	-	-
Cuarto trimestre	193	-	-
